

이 행 도	완료	이 행 른	10 20 30 40 50 60 70 80 90 완료
구 분	신규 / 임기내	주 체	시
재 원	도비 시비	정부도움	
주관부서	동남구 건설과	협조부서	


□ 목 표

- 노후되고 파손된 방음벽을 교체함으로써 도시 미관 저해 및 인근 아파트 주민 소음 불편 민원 해소


□ 개 요

- 기 간 : 2022. 9. 1. ~ 2022. 12. 31.
- 사 업 비 : 300백만 원 도비 150 시비 150
- 위 치 : 천안시 동남구 신방동 913번지 일원
- 총사업량 : 방음벽 교체 L=180m

위 치 도

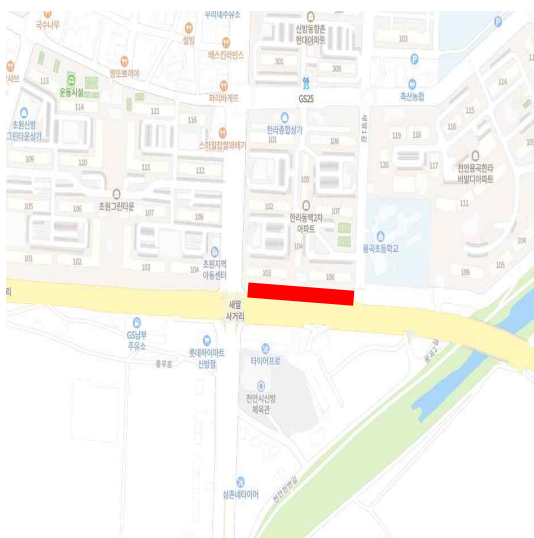

현 황 사 진

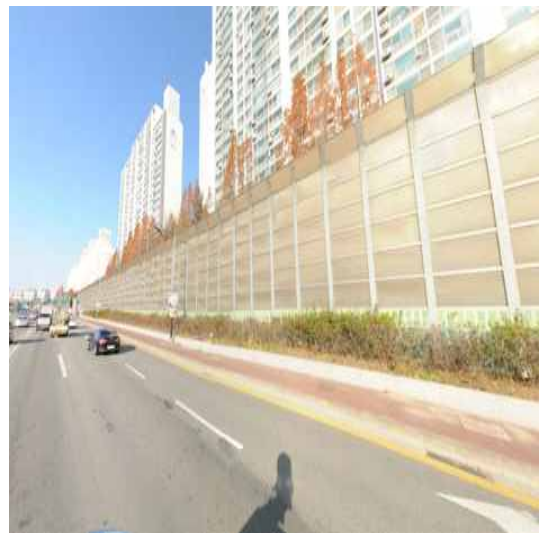

☐ 연차별 추진계획(로드맵)

추진내용	임기내																임기후
	2022		2023				2024				2025				2026		
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
계획(자재선정) 수립	■	■															
착공		■															
준공		■															

☒ 분기별 추진실적

구분	추진내용
'22년 4분기	22.10. 공사착공 22.12. 공사준공 및 준공검사

☐ 연차별 투자수요(소요예산)

단위 : 백만원

재원별	임기전	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	임기후
합계	300	-	300	-	-	-	-
도비	150	-	150	-	-	-	-
시비	150	-	150	-	-	-	-

☒ 연차별 집행실적

재원별	임기전	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	임기후
합계	300	300					
도비	150	150					
시비	150	150					

☐ 확인(성과)지표

단위 : %

확인지표	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기
공정율	100				

☒ **확인(성과)지표 이행실적**

확인지표	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기
공 정 율	100 완료				

☐ **시민참여계획**

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기타
○			○	

○ 공사 이전 일부 교통 통제 안내 및 공사 준공 홍보

☒ **시민참여 실적**

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기타
				-

